Cronoprogramma generale Waterfront Genova opere pubbliche.
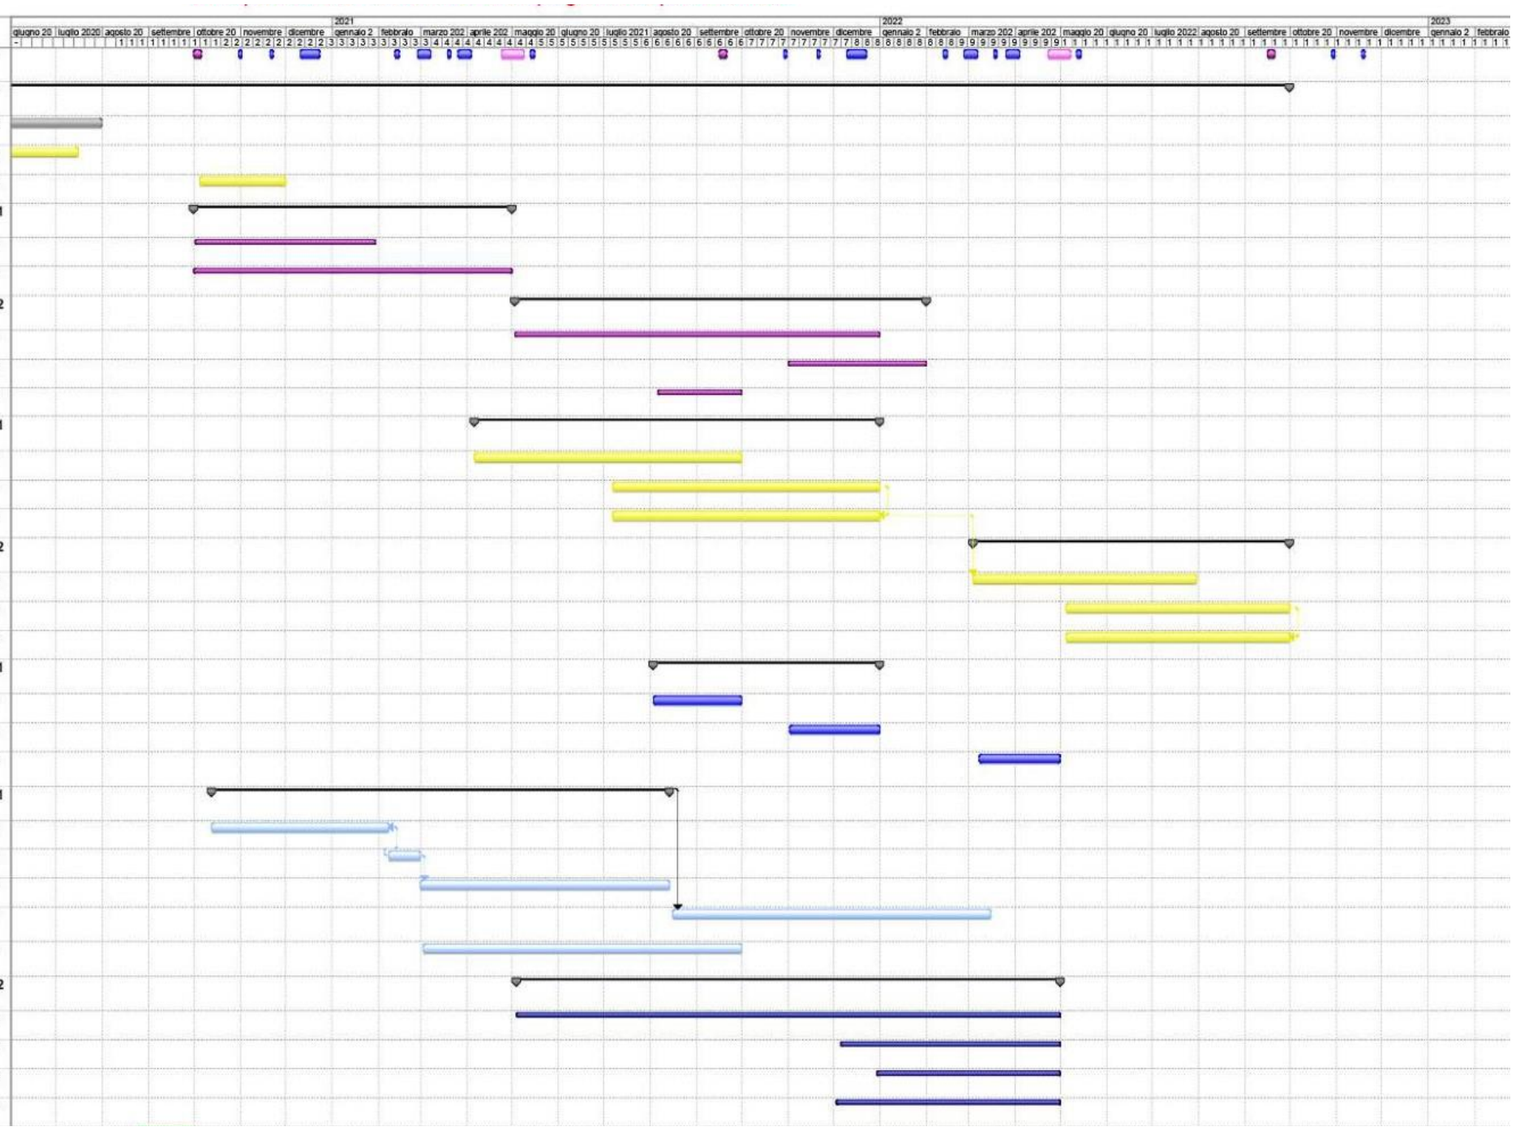
ID	Nome attività	Durata GL	Durata GNC	Inizio	Fine
1	**Fiere Genova**	**570 g**	**795 g**	**21/09/2020**	**25/11/2022**
112	*Comune di Genova - Waterfront Levante*	**851 g**	**1188 g**	**01/07/2019**	**30/09/2022**
113	Imbocco canale	285 g	397 g	01/07/2019	31/07/2020
114	Cavidotto e demolizione Palazzina uffici	65 g	91 g	16/04/2020	15/07/2020
115	Demolizione biglietterie	41 g	57 g	05/10/2020	30/11/2020
116	**Demolizione PAD D**	**152 g**	**212 g**	**01/10/2020**	**30/04/2021**
117	Demolizione scala	120 gt	120 g	01/10/2020	29/01/2021
118	Demolizione fabbricato (accessibilità demolitori non garantita nel lotto CDS)	152 g	212 g	01/10/2020	30/04/2021
119	**Opere Canaletto**	**196 g**	**274 g**	**03/05/2021**	**31/01/2022**
120	Canaletto (completo tutto il fronte ovest) e banchine	175 g	243 g	03/05/2021	31/12/2021
121	Ponte Canaletto	66 g	92 g	01/11/2021	31/01/2022
122	Volumi quota banchine per associazioni - lotto 2.1 (strutture elevazione e solai associazioni)	40 g	56 g	06/08/2021	30/09/2021
123	**Interventi Primo lotto levante**	**194 g**	**270 g**	**06/04/2021**	**31/12/2021**
124	Viabilità da Piazzale Kennedy a rotonda lotto 2.6	128 g	178 g	06/04/2021	30/09/2021
125	Aree verdi, escluso lotto 2b	128 g	178 g	07/07/2021	31/12/2021
126	Restauro muratura e sopraelevata	128 g	178 g	07/07/2021	31/12/2021
127	**Interventi Secondo lotto ponente**	**152 g**	**211 g**	**04/03/2022**	**30/09/2022**
128	Viabilità lotto 2a e 2.6	107 g	149 g	04/03/2022	30/07/2022
129	Aree verdi	107 g	149 g	05/05/2022	30/09/2022
130	Restauro muratura e sopraelevata	107 g	149 g	05/05/2022	30/09/2022
131	**altri interventi viabilità**	**109 g**	**151 g**	**03/08/2021**	**31/12/2021**
132	Sistemazione incrocio semaforico piazzale Kennedy	43 g	59 g	03/08/2021	30/09/2021
133	Sistemazione area verde lotto 2.2 B	44 g	60 g	02/11/2021	31/12/2021
134	**Ascensore urbano via Saffi (opera pubblica a scomputo oneri per il privato)**	40 g	54 g	08/03/2022	30/04/2022
135	**Demolizione PAD C**	**219 g**	**305 g**	**13/10/2020**	**13/08/2021**
136	Bonifica parte 1	118 gt	118 g	13/10/2020	08/02/2021
137	Demolizione parte 1 (interferente con autorimessa)	15 g	21 g	08/02/2021	28/02/2021
138	Bonifica e demolizione parte 2	120 g	166 g	01/03/2021	13/08/2021
139	**Demolizione PAD M**	152 g	212 g	16/08/2021	15/03/2022
140	**Demolizione Edifici via Pescatori**	152 g	212 g	03/03/2021	30/09/2021
141	**Opere canale principale**	**260 g**	**362 g**	**04/05/2021**	**30/04/2022**
142	Canale Principale e banchine	260 g	362 g	04/05/2021	30/04/2022
143	Ponte Canale Principale	106 g	146 g	06/12/2021	30/04/2022
144	Volumi quota Banchina Canale Principale - lotto 5	88 g	122 g	30/12/2021	30/04/2022
145	Rampe PAD Jean Nouvel	107 g	149 g	03/12/2021	30/04/2022
